Station Châtelet

RATP - Département de la Maîtrise d'ouvrage des projets
Conduite de Projets

Rénovation de la station Châtelet L1-4-7-11
Février 2014 / Juillet 2016

Réunion publique 23 septembre 2015

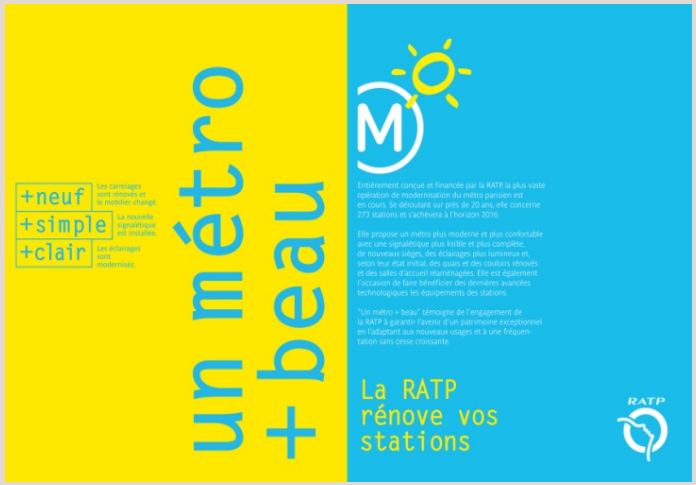

Sommaire

1. Opération Renouveau du Métro - RNM
2. État de la station
3. Aménagements
4. Etat d'avancement travaux
5. Mises en service
6. Travaux de l'opération
7. Aménagements spécifiques

Opération Renouveau du Métro - RNM

1.1

- Depuis 1999 programme de rénovation des stations : confort / fluidité / lumière / mise en ordre / lumière / services / information voyageurs/ sécurité incendie

- 266 stations
  - 275 opérations de requalification des salles et accès 272 000 m²
  - 105 opérations de réhabilitation de l'aménagement des quais 70 4000 m²
  - 193 opérations de réhabilitation des luminaires de quai 29 km

- 477 opérations réalisés sur 248 stations

Opération Renouveau du Métro - RNM

1.2

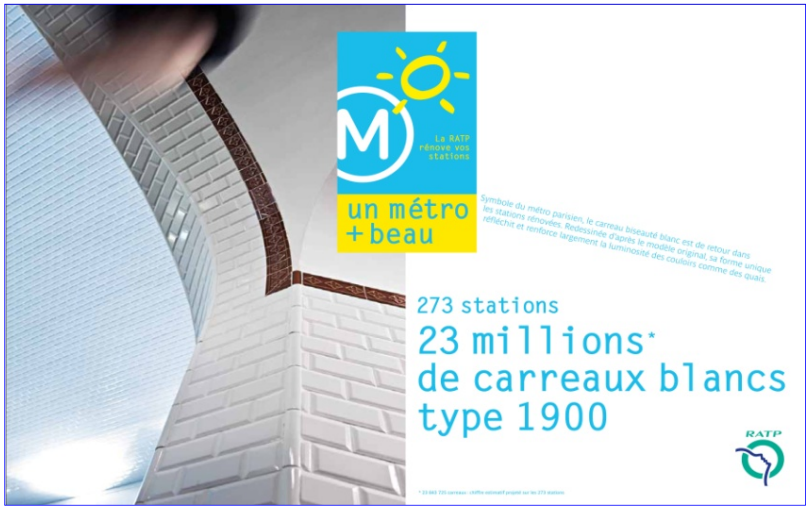

Opération Renouveau du Métro - RNM

1.3

Opération Renouveau du Métro - RNM

1.4

Station CHATELET

2.1

État de la station : très dégradé

- Fissures et infiltrations dans les couloirs
- Dégradation des parements muraux
- Espaces non mis en valeur
- Aménagements disparates
- Vétusté des espaces d’accueil et des équipements
- Espaces sombres et peu rassurants

Station CHATELET

2.2

État de la station

Aménagements

Des travaux innovants :

- Éclairage de la station entièrement à LED
- Ecrans d'informations dynamique
- Nouveau dispositif d'accueil
- Passages voyageurs élargis
- Système de sonorisation
- Système de sécurité incendie
- Couleur des frises/plinthes
- Poubelles redisignées
- Aménagements spécifiques
- Signalétique voyageurs

Opération RNM – Avancement projet

Secteur RIVOLI – Ligne 4

Phase 1.1 – Ligne 4
Travaux de mise en provisoire (en nuits courtes) [Terminés]

Phase 1.2 – Ligne 4
Travaux de réhabilitation TCE (en nuits courtes) – Avancement travaux : 70 %. Fin prévue pour mars 2016

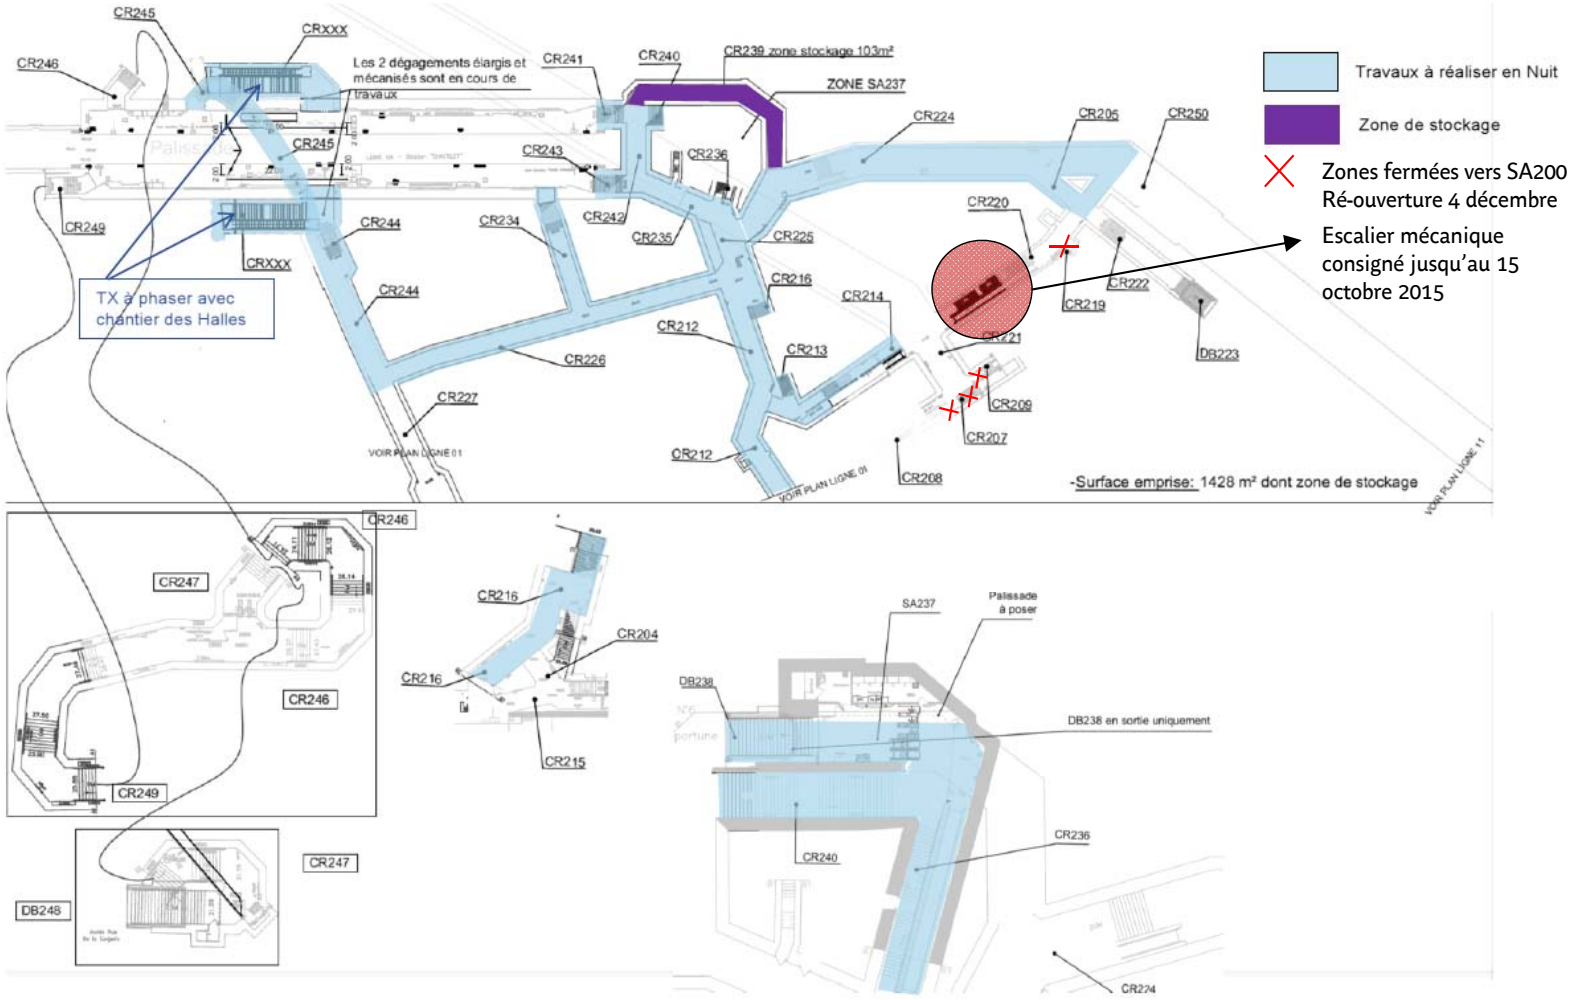

Opération RNM – Avancement projet

Secteur RIVOLI – Ligne 1

Phase 2.1 – Ligne 1

Travaux de mise en provisoire (en nuits courtes) [Terminés]

Phase 2.2 – Ligne 4

Travaux de réhabilitation TCE (en nuits courtes) – Avancement travaux : 65 %. Fin prévue pour mars 2016.

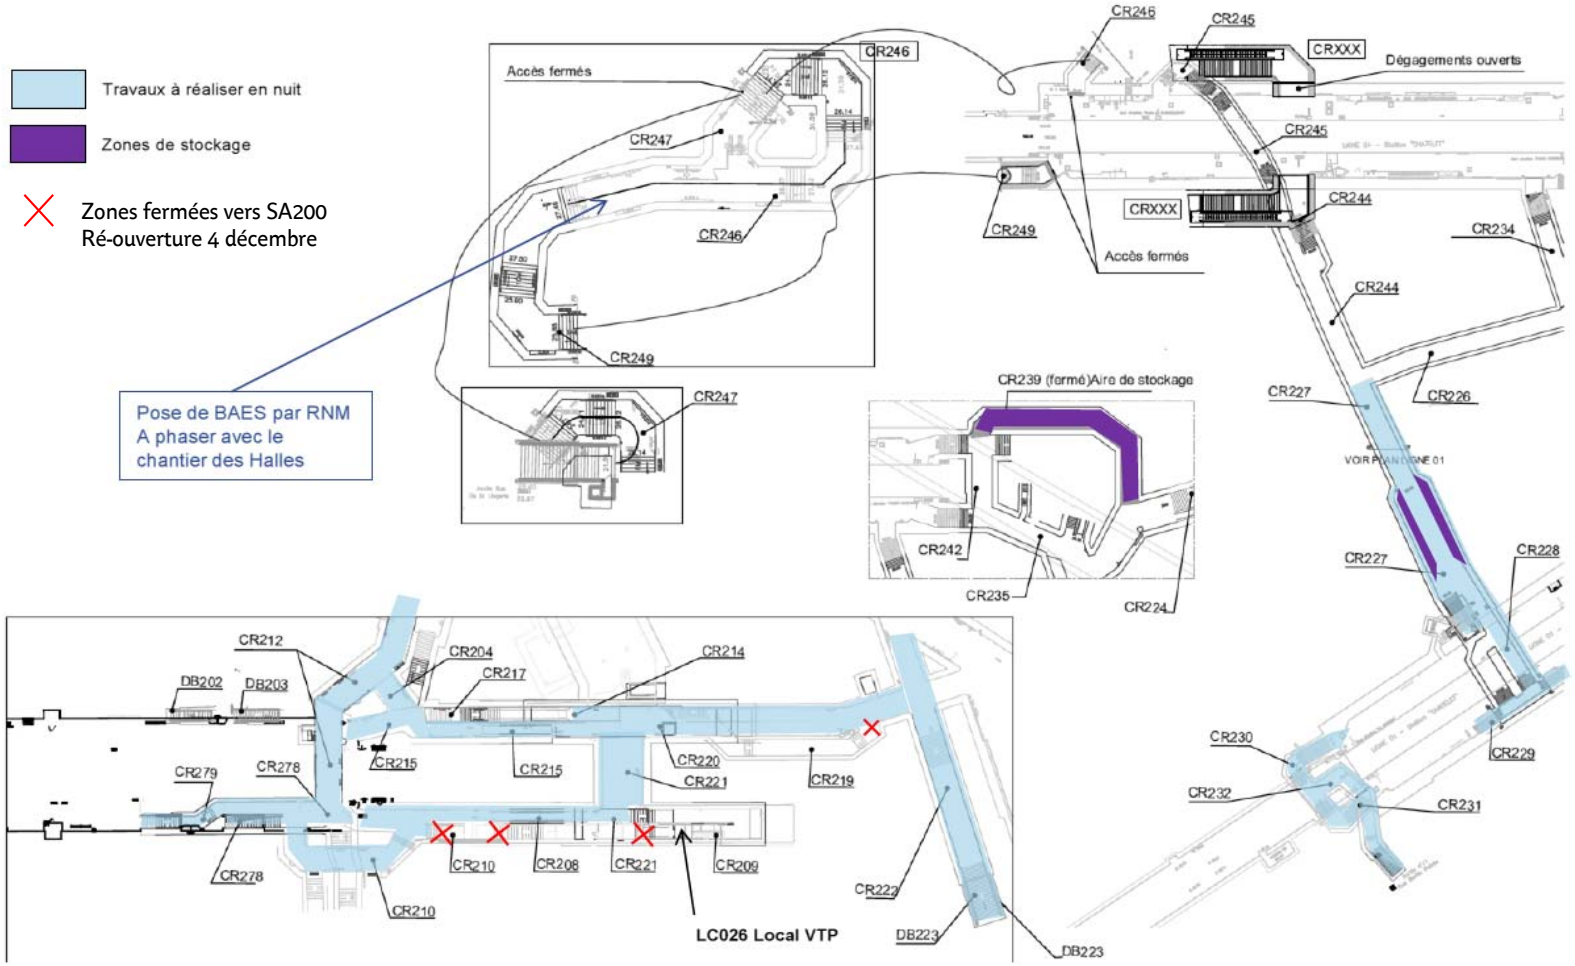

Opération RNM – Avancement projet

Secteur RIVOLI – SA200

Phase 3.1 – Ligne 1 SA 200
Travaux de mise en provisoire (en nuits courtes) [Terminés]

Phase 3.2 – Ligne 1 SA 200 - Fermeture 12 semaines : 6/09/15 au 4/12/15
Travaux de réhabilitation TCE (en journées et en nuits longues)

Débouchés Rue Rivoli fermées en voirie

Zones de chantier interdites au public

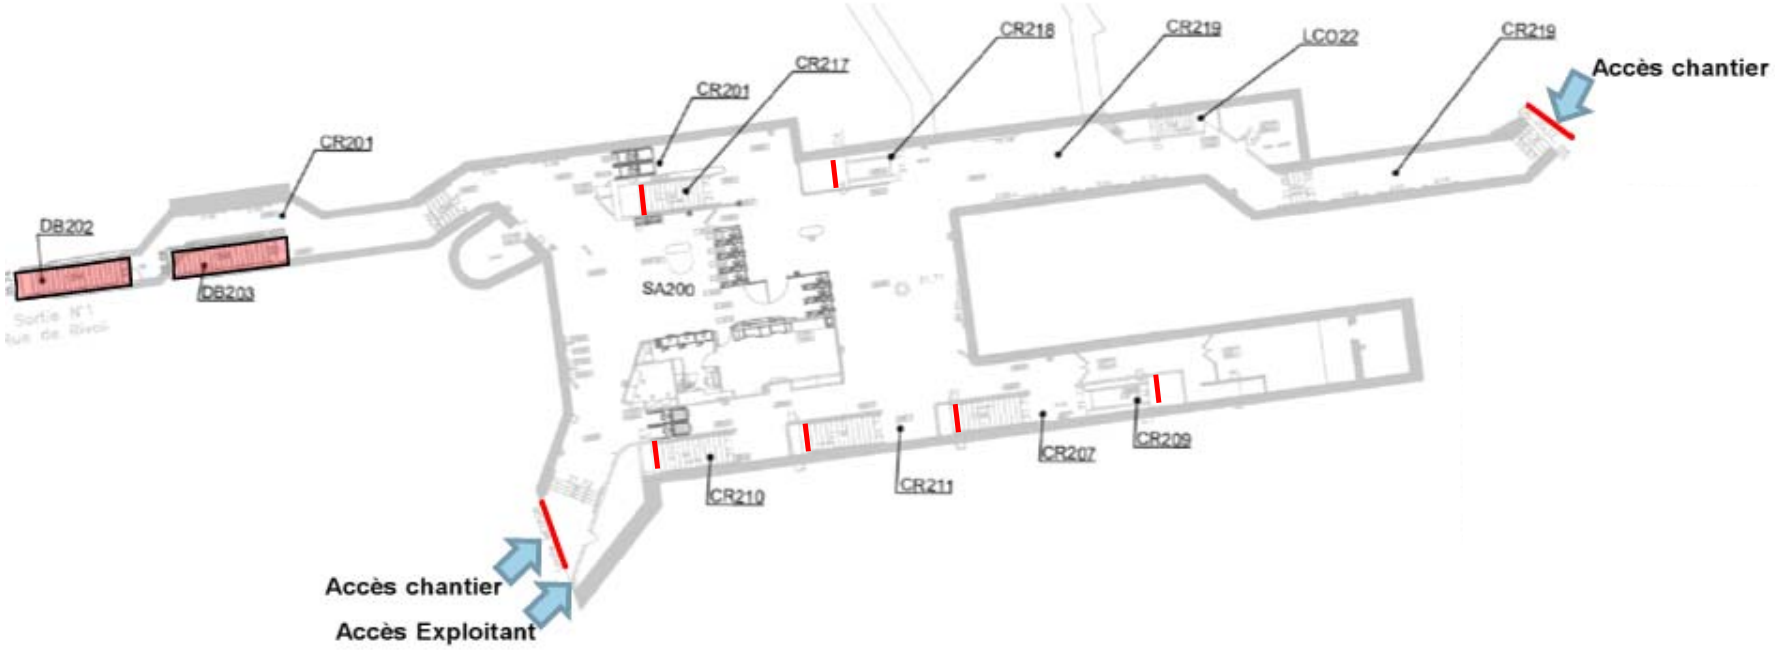

Opération RNM – Avancement projet

Secteur Seine – L7

Phase 4.1 – Ligne 7 et SA251
Travaux de mise en provisoire (en nuits courtes) [terminés]

Phase 4.2 – SA 251 et accès
Travaux de réhabilitation TCE (en journées et en nuits longues) – Avancement 90 %. Fin prévue pour décembre 2015

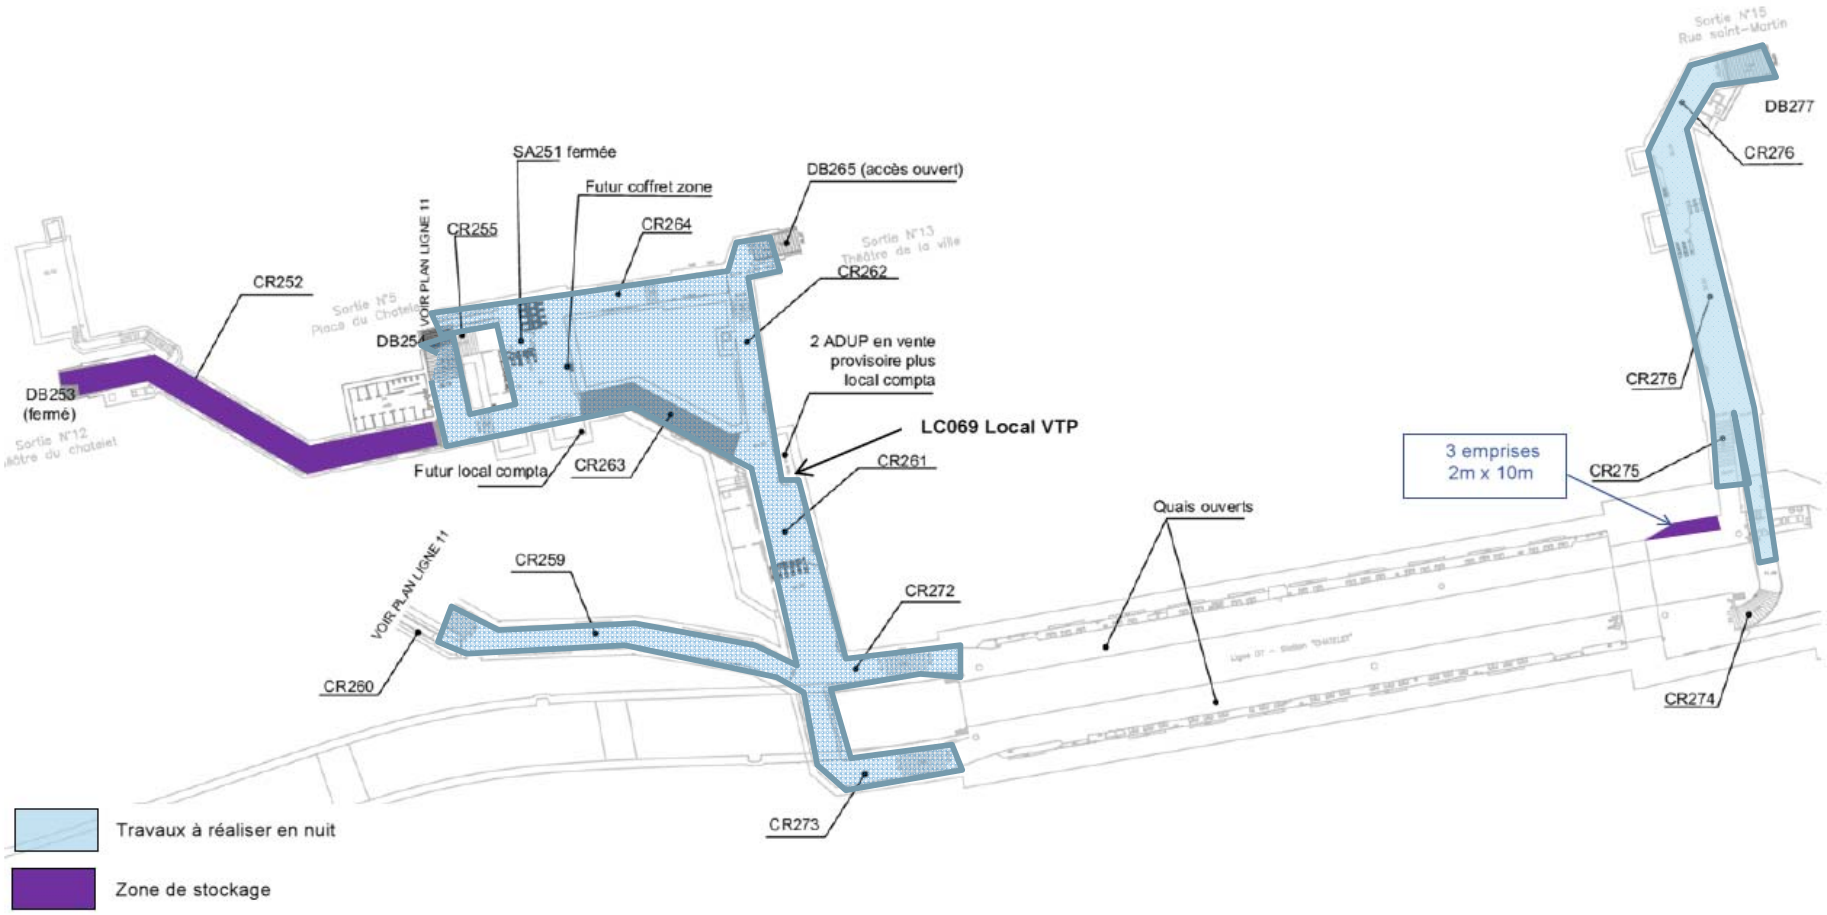

Opération RNM

Secteur SEINE

4.5

Phase 5.1 – Ligne 11

Travaux de mise en provisoire (en nuits courtes) – 18 février 2014 au 27 octobre 2014 (y compris dépose tapis roulants)

Phase 5.2 – Ligne 11

Travaux de réhabilitation TCE (en nuits courtes) – Avancement : 70 %, Fin prévue en décembre 2015

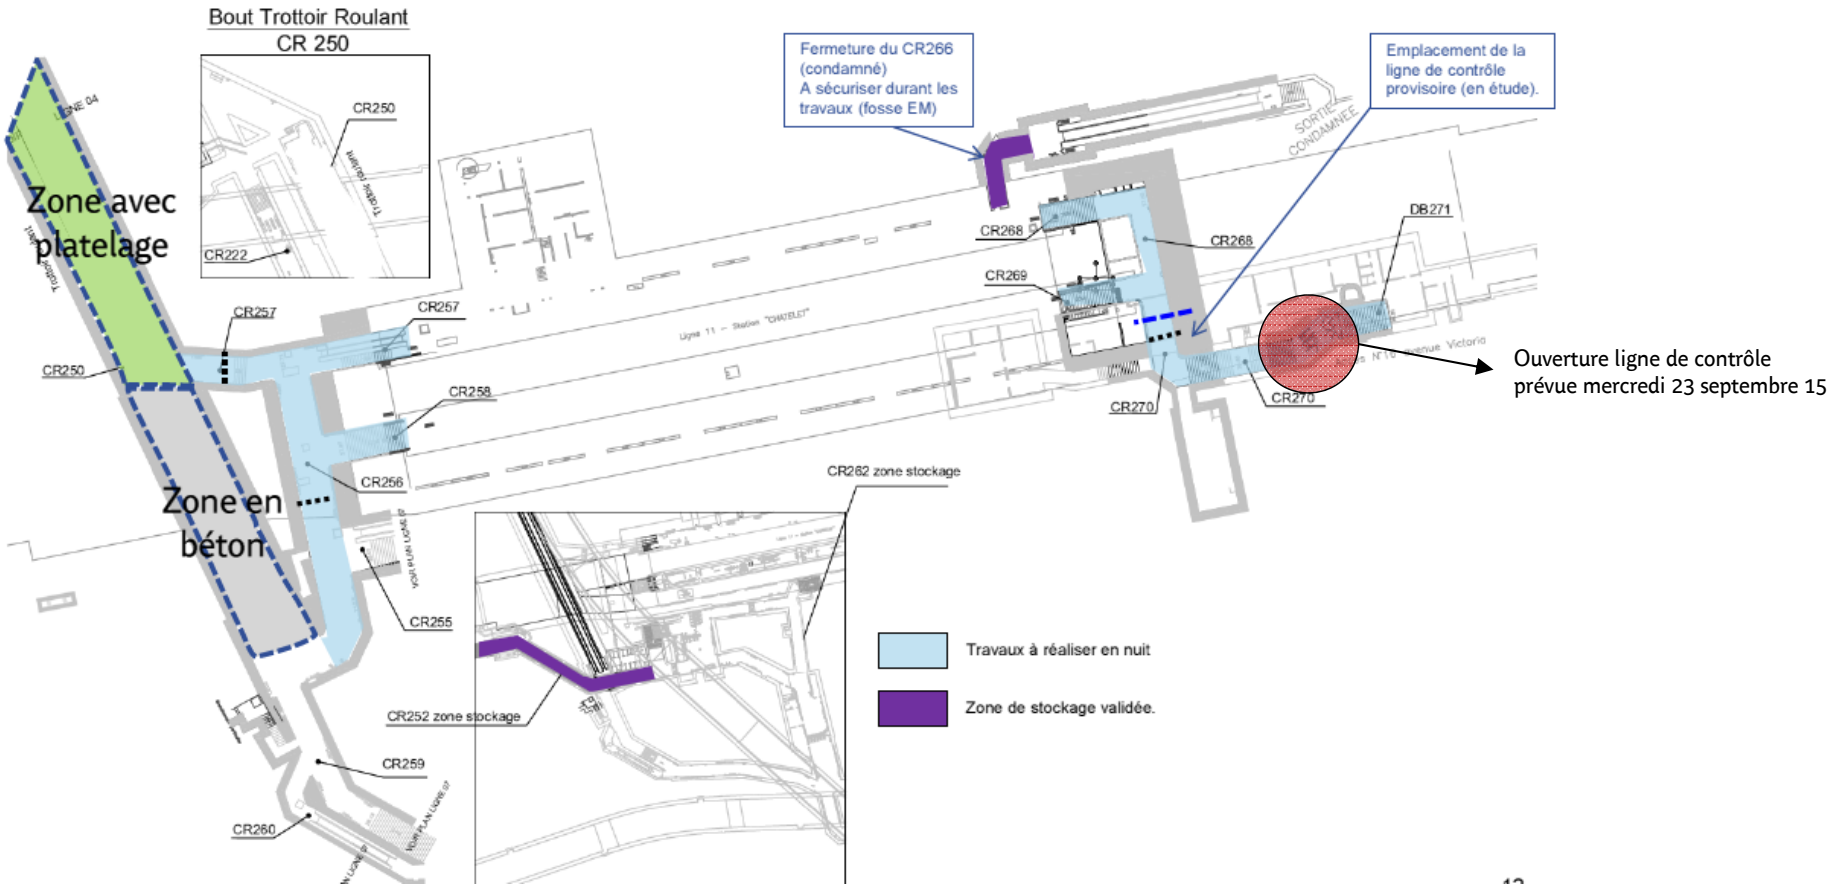

Opération RNM

Secteur SEINE – CR250

4.6

Phase 5.2 – Ligne 11

Habillage spécifique TCE (en nuits courtes) – du 5/10/15 au 4 juillet 2016

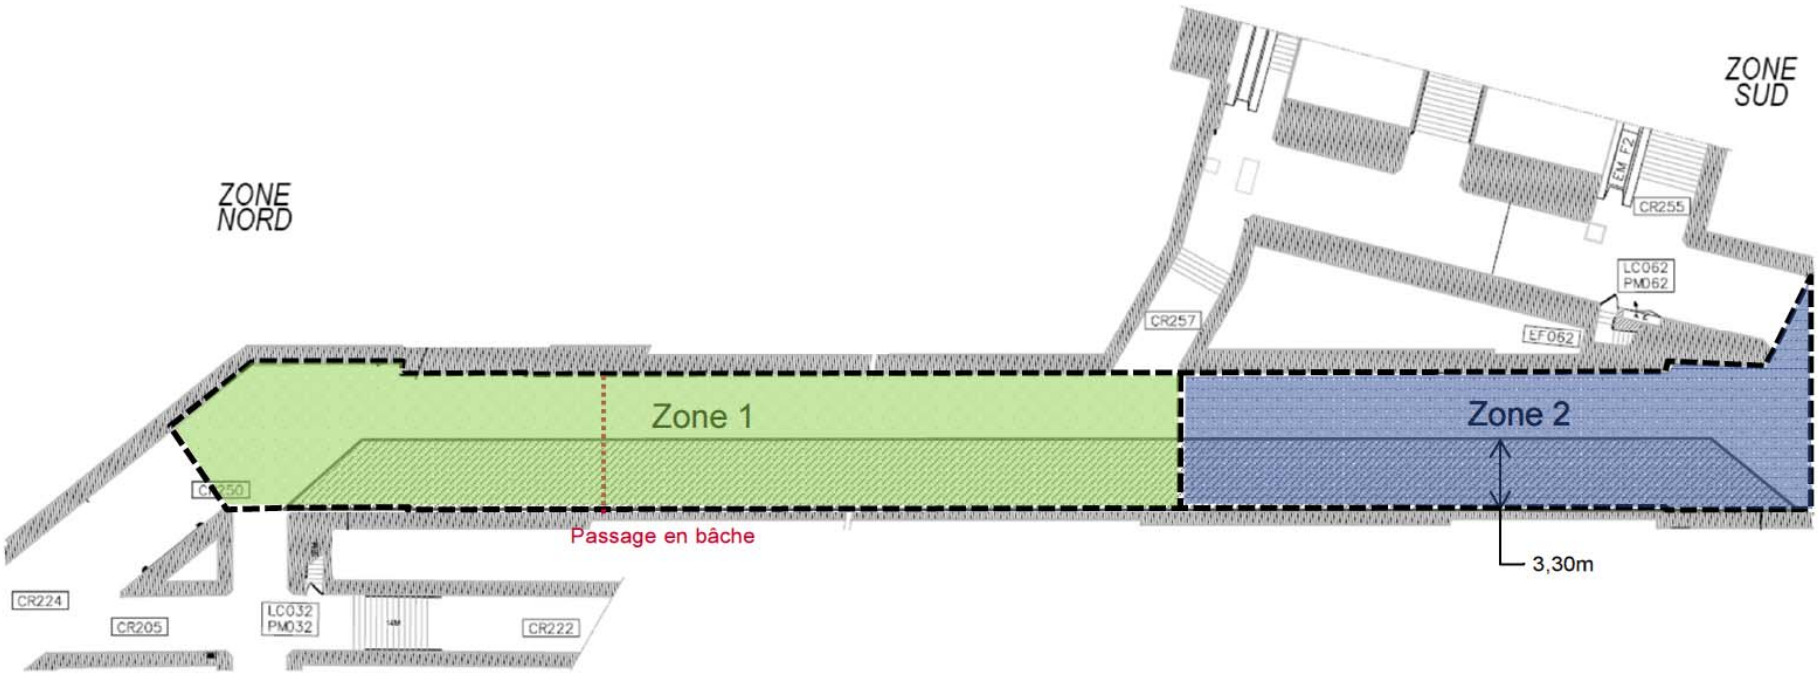

Mises en service

Réalisées

- Lignes de contrôle SA251 et CR261 (secteur Seine – Place du Châtelet)
- Ligne de contrôle SA237 (accès Sainte Opportune)
- Guichet D SA251 depuis le 6/12/14 (secteur Seine – Place du Châtelet)
- Appareil de vente accès Ste Opportune (secteur Rivoli)
- Appareils de vente SA251 (secteur Seine)
- Ligne de contrôle L7 (accès Saint Martin)
- Ligne de contrôle L1 (accès rue Saint Denis)
- Ligne de contrôle L1 (accès Bertin Poirée)

A court terme

- Ligne de contrôle L11 (accès Victoria) – 23 septembre 2015
- SA200 – Décembre 2015

A long terme

- SA250 – Juillet 2016
- Trottoirs roulants TRA/TRB – 2016 / 2017

Travaux de l'opération

Secteurs RIVOLI et SEINE

6.2

Le chantier en image

Avant

En cours

Travaux de l'opération

Secteurs RIVOLI et SEINE

6.1

Le chantier en image

Avant

En cours

Travaux de l'opération

Secteurs RIVOLI et SEINE

6.2

Le chantier en image

Avant

En cours

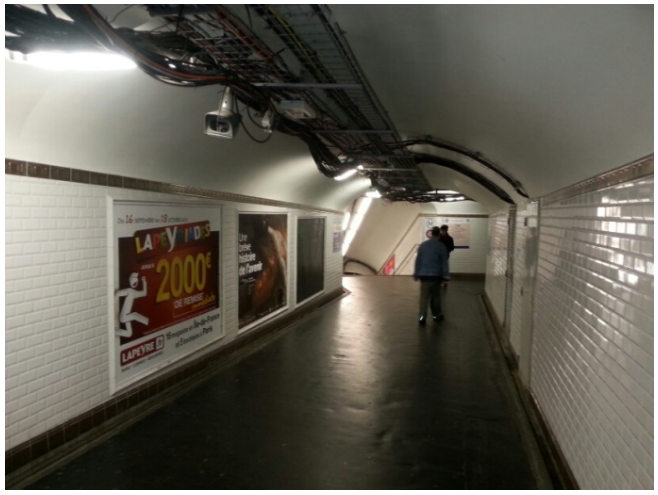

Aménagements spécifiques

7.1

Couloir CR250

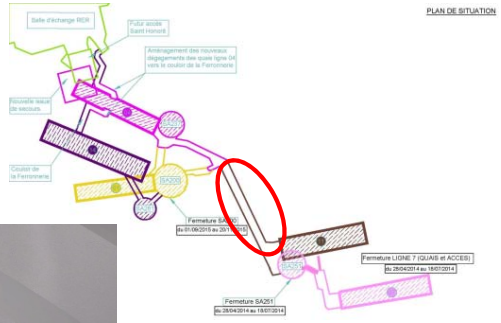

Aménagements spécifiques

Couloir CR250

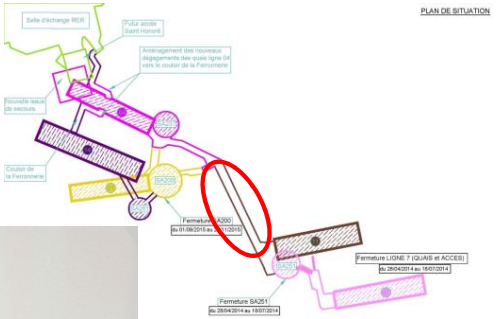

Aménagements spécifiques

7.3

Salle des musiciens

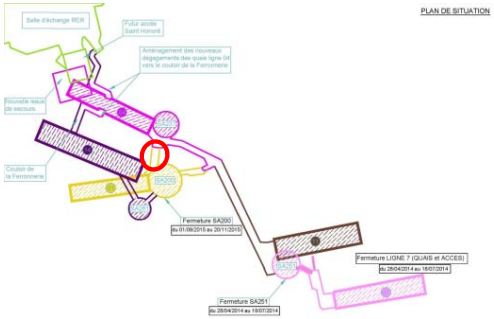

Aménagements spécifiques

Salle d'échange SA200

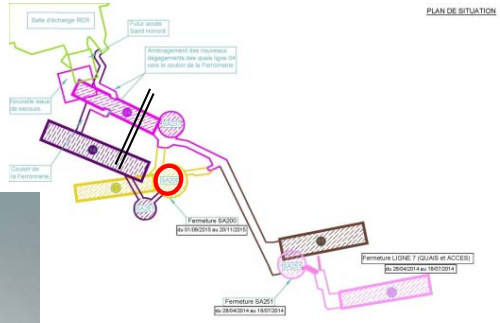

Aménagements spécifiques

Salle d’échange SA251

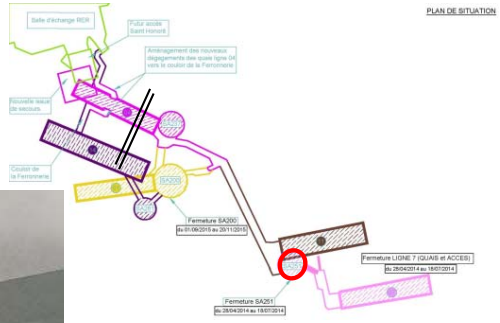

Aménagements spécifiques

Zone de transition Projet pôle / Projet RNM

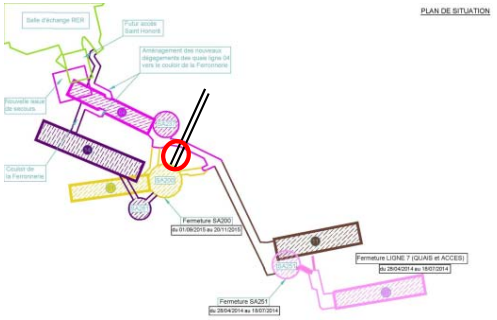

Station Châtelet

RATP - Département de la Maîtrise d'ouvrage des projets
Conduite de Projets

Rénovation de la station Châtelet L1-4-7-11
Février 2014 / Juillet 2016
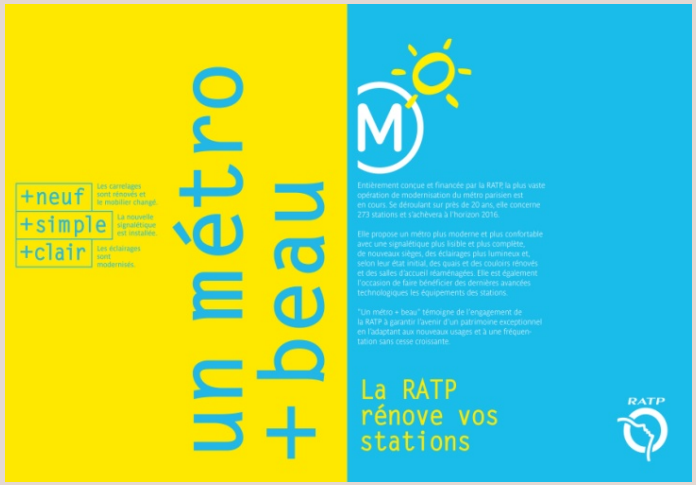
Réunion publique 23 septembre 2015
